
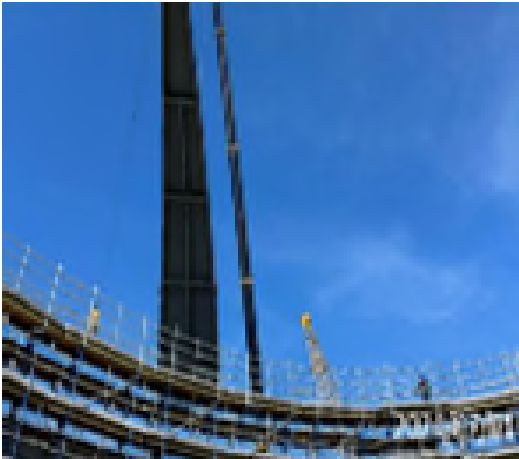



工程施工現況報表

截止日期:113/07/03

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林儲運中心2座各3萬公秉乙烯/丙烯冷凍槽及其附屬設施新建統包工程	KDC0939001	1050日曆天	0	11	111/11/01	611+11	439	114/09/21	46.66%

工程施工概況照片

拍照日期	113.07.03	
說明：PR3-5基礎柱鋼筋籠焊接。		
拍照日期	113.07.01	
說明：T-3101 Outer Roof Block吊裝。		
拍照日期	113.06.30	
說明：T-3101第7th環梁鋼筋綁紮組立		
