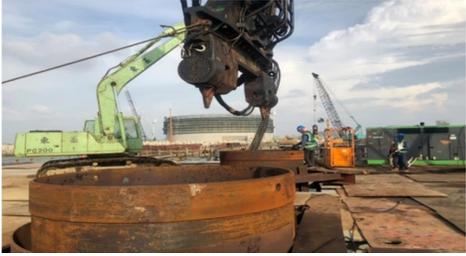


# 中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：109 年 7 月 16 日

進度統計截止日期：109 年 7 月 15 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>第 1 座儲槽</b>：混凝土外牆共 11 昇層，109 年 7 月 9 日完成第 6 昇層混凝土澆置，正進行第 7 昇層鋼筋組立。</li><li>2. <b>第 2 座儲槽</b>：109 年 6 月 14 日已完成所有工作樁打設 (共 372 支)，刻正進行樁頭處理及降挖。</li></ol>	 <p><b>第 1 座儲槽鋼筋組立</b></p>  <p><b>第 2 座儲槽樁頭處理</b></p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>沉箱預製</b>：持續於台北港進行沉箱預製工作，已完成 40 座沉箱暫置於台北港。</li><li>2. <b>沉箱拖放</b>：已於 109 年 7 月 11 日、12 日、15 日完成 3 座沉箱拖放作業。</li><li>3. <b>林口預製場</b>：a 卵石進場。</li></ol>	 <p><b>沉箱預製</b></p>  <p><b>a 卵石進場</b></p>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>正進行施工便橋(已完成55.83%)及主體工程(基樁施作、外套鋼管打設)施作。</p>	 <p>施工便橋施作</p>  <p>外套鋼管打設</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行細部設計工作，已完成28.03%。</p>	<p>現場尚無施工。</p>

# 中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

