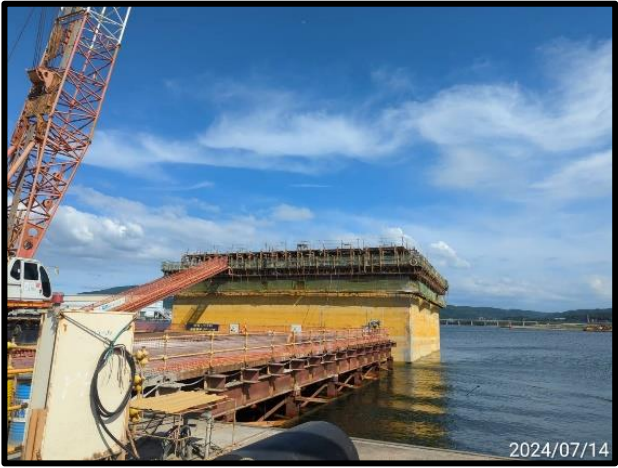


中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：113 年 07 月 23 日

進度統計截止日期: 113 年 07 月 22 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	建港及圍堤造地工程	1. 沉箱預製：已完成 208 座沉箱預製。 2. 沉箱混凝土澆置：已完成 138 座(含碼頭後線 80 座、LNG 碼頭 21 座及北防波堤 37 座)。	 北聯外道路鋼模組立  北聯外道路防塵網覆蓋

二	外廓防波堤新建工程	1. 沉箱預製：已完成 43 座沉箱預製，現持續進行第 44~46 座沉箱。 2. 沉箱拖放：已完成防波堤外推(#37 以後)35 座沉箱拖放定位。 3. 沉箱回填：25 座(#37 以後)沉箱回填全數完成。	 2024/07/14 沉箱(BF-89)底版鋼筋綁紮  2024/07/14 沉箱(BF-87)本體養護
----------	------------------	--	---

三	棧橋工程	1. 主橋面段及彎管平台皆已全數移交中鼎進場施作橋面配管。 2. 現進行外腹板、人行欄杆基座外觀修飾及擋土牆透空式護欄基座外觀修飾等工項。	 113.07.01 路堤段級配層滾壓夯實  113.07.15 外腹板、人行欄杆基座外觀修飾
---	------	--	---

四	儲槽工程	1. 第 1 座儲槽：現進行儲槽氮氣封存監控，待 LNG 進液試車。 2. 第 2 座儲槽：現進行儲槽氮氣封存監控，待 LNG 進液試車。	 第 1 座儲槽 護坡整地  第 2 座儲槽 斜坡護欄模板組立
---	------	---	---

五	氣化設施工程	現進行主變電站電纜耐壓測試、製程變電站 2 樓室內栓系統配管前置作業、中央控制室屋突油漆噴漆等工項。	 車道底版混凝土澆置  牆身混凝土澆置
----------	---------------	---	---

六

陸管及配
氣站工程

現進行配氣站管線油漆、
接收站螺栓鎖固、隔離站
音波測漏設備安裝及儀電
配管拉線接設備等工項。



管線油漆塗裝



儀電配管拉線接設備

七	外推製程 設備與管 線	現進行配管基礎放樣、植 筋鑽孔及卸料臂控制室消 防管預埋等工項。	 113.07.09 配管基礎放樣、植筋鑽孔  113.07.09 卸料臂控制室消防管預埋
---	-------------------	--	---

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

