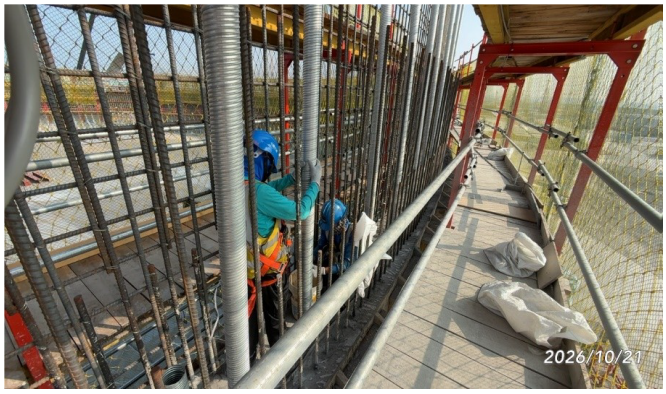
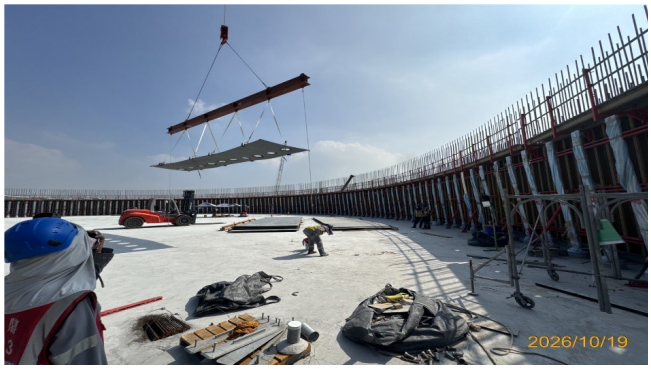
工 程 施 工 現 況 報 表

截止日期:115/10/27

工程名稱	工程案號	契約工期	合意展延	停工天數	開工日期	累計工期	剩餘工期	預定完工日期	完成進度(%)
洲際接收站LNG儲槽興建統包工程	KDC1249001	2020日曆天	0.5	16	114/02/27	604	1432	119/09/24	32.20%

工程施工概況照片

拍照日期	115.10.21
說明：T-101 垂直預力套管安裝(第三昇層)	
拍照日期	115.10.19
說明：T-102 外槽底板進板	
拍照日期	115.10.21
說明：T-103 加熱管安裝	
