工 程 施 工 現 況 報 表

截止日期:115/08/12

工程名稱	工程案號	契約工期	合意展延	停工天數	開工日期	累計工期	剩餘工期	預定完工日期	完成進度(%)
大林石化油品儲運中心鍋爐系統統包工程	KDJ1039001	950日曆天	131	32	112/11/17	968+32	113	115/12/03	94.4326%

工程施工概況照片
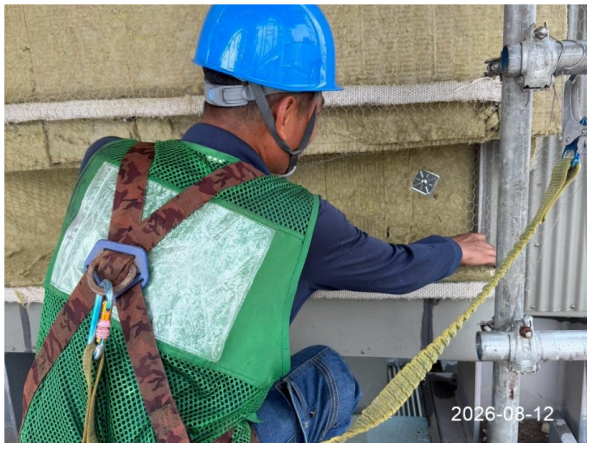
拍照日期	115.08.11
說明：迴路測試	
拍照日期	115.08.12
說明：脫硝系統內部整理	
拍照日期	115.08.12
說明：脫硝門板保溫及缺失改善
